

Mini Granja Solar Villa Sol

Sabanas de Beltrán, San Pedro, Sucre | 1.366,2 kWp

42.5%


AVANCE

0.98

SPI

 A tiempo

01 LÍNEA DE HITOS



02 CONDICIONES CLIMÁTICAS



Soleado — 32°C

Sin precipitaciones. Condiciones óptimas para trabajo.


8.5

HRS TRABAJO

0

HRS LLUVIA

03 ESTADO DE AVANCE

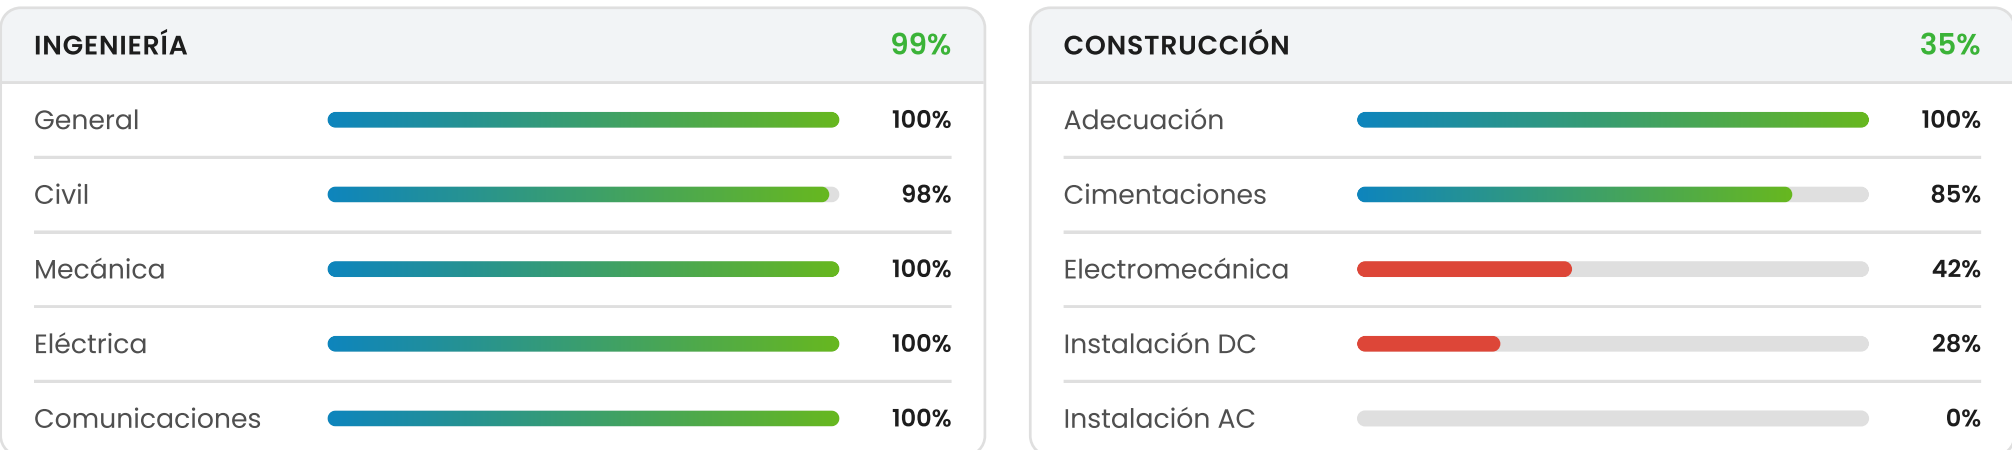

04 PERSONAL Y EQUIPOS EN SITIO

PERSONAL				Solenium: 8 Subcontratistas: 19
CARGO	CANT.	GENERO	TIPO	
Residente	2	2H	Solenium	
Almacenista	1	1M	Solenium	
Tec. Electrico	1	1H	Solenium	
SISO	2	1H 1M	Solenium	
Oficial	2	2H	Solenium	
Ayud. Electrico	17	15H 2M	Subcontratista	
Ayud. Obra	2	2H	Subcontratista	
Total	27	23H / 4M		—

MAQUINARIA / EQUIPOS	
Ahoyadora	2
Camioneta 4x4	4
Escaleras tipo tijera	4
Torquimetro digital	1
Set de raches	1

MANO DE OBRA LOCAL	
MOC (Calificada)	60%
MONC (No Calif.)	85%

05 ACTIVIDADES DEL DÍA

EJECUTADAS HOY	
SST	Charla de seguridad: Plan de prevención y respuesta ante emergencias. Pausas activas y señalización de áreas.
CIVIL	Vaciado de concreto en cimentación de shelter. Compactación de vía de acceso principal.
MEC	Montaje de estructura tracker en filas 6-7. Ajuste de torque en tornillería de soporte.
ELEC	Rotulado, peinado y tendido de cable DC. Instalación de PT para hincas en strings 15-20.

PROYECTADAS MAÑANA	
SST	Charla: Cuida de ti para cuidar de otros. Pausas activas.
CIVIL	Continuación de obras de cimentación shelter.
MEC	Continuar montaje de estructura tracker fila 8.
ELEC	Rotulado, peinado y tendido del cable DC. Instalación de PT.

06 INDICADORES HSSE DEL DÍA

SEGURIDAD

0

INCIDENTES

229.5

HH TRABAJADAS

Sin incidentes

0

CUASI ACCIDENTES

1

CHARLAS SST

EPP: Inspeccion diaria completada. 27/27 trabajadores con EPP en buen estado.

GESTION SOCIAL

PQRS Recibidas

0

PQRS Resueltas

0

Reuniones Comunidad

0

Horas Paralizacion

0

Compras Locales (\$)

\$350,000

GESTION AMBIENTAL

Consumo Energia

45 kWh

Consumo Agua

0.8 m3

Derrames

0

12 kg

ORDINARIOS

8 kg

RECICLABLES

0 kg

RESPEL

07 SUMINISTROS Y TRÁMITES

ESTADO DE SUMINISTROS		
ELEMENTO	ESTADO	FECHA
Paneles (2,376)	ENTREGADO	21/03
Trackers (12)	ENTREGADO	15/03
Inversores (3)	EN TRÁNSITO	23/03
Cable AC (450m)	PENDIENTE	—
Shelter	FABRICACIÓN	10/04

ESTADO DE TRÁMITES / RTB		
CREG 174 Aprobado 26/01	Nuevas Conexiones En revisión Afinia	UPME Certificado favorable
Licencia Const. Aprobada	Corp. Ambiental Aprobado	RETIE Pendiente inspección

08 RUTA CRÍTICA Y SEGUIMIENTO

RIESGOS IDENTIFICADOS	
Retraso en llegada de inversores	Nueva fecha: 23 Mar. Impacto: 5 días. Mitigación: Ajuste de secuencia de montaje.
Pendiente certificación RETIE	Visita inspector semana 15. Requiere 80% de instalación eléctrica completada.

CURVA S		SPI: 0.98
		
Planeado	Real	Proyección

09 REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Civil	 Eléctrica	 Mecánica	 SST
--	--	---	--

10 CONTROL DE CALIDAD (PPI)

INSPECCION / ENSAYO	UBICACION	RESULTADO	OBSERVACIONES
Torque de tornilleria tracker	Filas 6-7	APROBADO	Valores dentro de especificacion
Slump test concreto	Cimentacion shelter	APROBADO	4" - Cumple f'c 3000 psi
Continuidad cable DC	Strings 15-20	APROBADO	Sin discontinuidades
