

Mini Granja Solar Villa Sol


Sabanas de Beltrán, San Pedro, Sucre | Capacidad: 1.366,2 kWp

42.5%
AVANCE TOTAL
+4.8% semana

6/6
DÍAS TRABAJADOS

A tiempo

01 LÍNEA DE HITOS DEL PROYECTO




02 RESUMEN DIARIO DE LA SEMANA

DÍA	FECHA	CLIMA	PERSONAL	HRS TRABAJO	AVANCE	ACUMULADO
Lun	17 Mar	☀️ Soleado	25	8.5h	+0.8%	38.5%
Mar	18 Mar	☀️ Soleado	27	9.0h	+1.0%	39.5%
Mié	19 Mar	☁️ Lluvia 2h	22	6.0h	+0.5%	40.0%
Jue	20 Mar	☁️ Nublado	26	8.0h	+0.7%	40.7%
Vie	21 Mar	☀️ Soleado	28	9.0h	+0.9%	41.6%
Sab	22 Mar	☀️ Soleado	28	9.0h	+0.9%	41.6%

03 INDICADORES DE LA SEMANA



04 ESTADO DE AVANCE

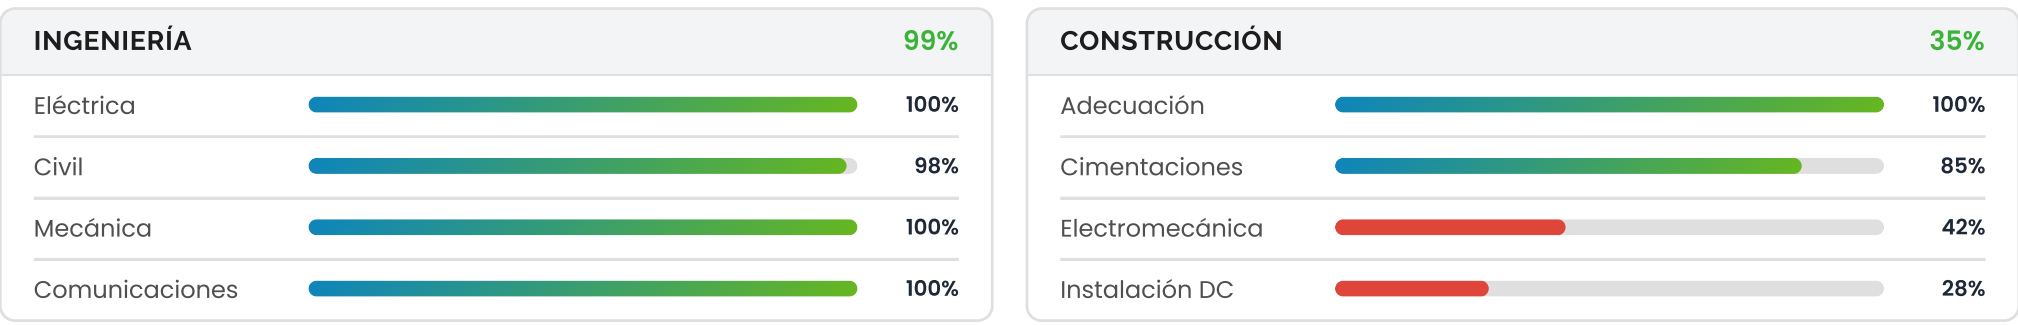


05 CANTIDADES EJECUTADAS VS PROGRAMADAS


ACTIVIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO SEMANA	EJECUTADO SEMANA	DIFERENCIA	ACUM. PROYECTO	% TOTAL
Hincas instaladas	und	180	192	+12	1,008	42%
Paneles montados	und	180	192	+12	1,008	42%
Cable DC tendido	ml	350	320	-30	1,120	28%
Cimentaciones shelter	m3	8	8	0	17	85%
Estructuras tracker	und	2	2	0	5	42%

Análisis de Variaciones:
Cable DC: Retraso de 30ml debido a espera de llegada de conectores MC4. Se recuperara en semana 13 con turno extendido.

06 LOGROS Y RIESGOS

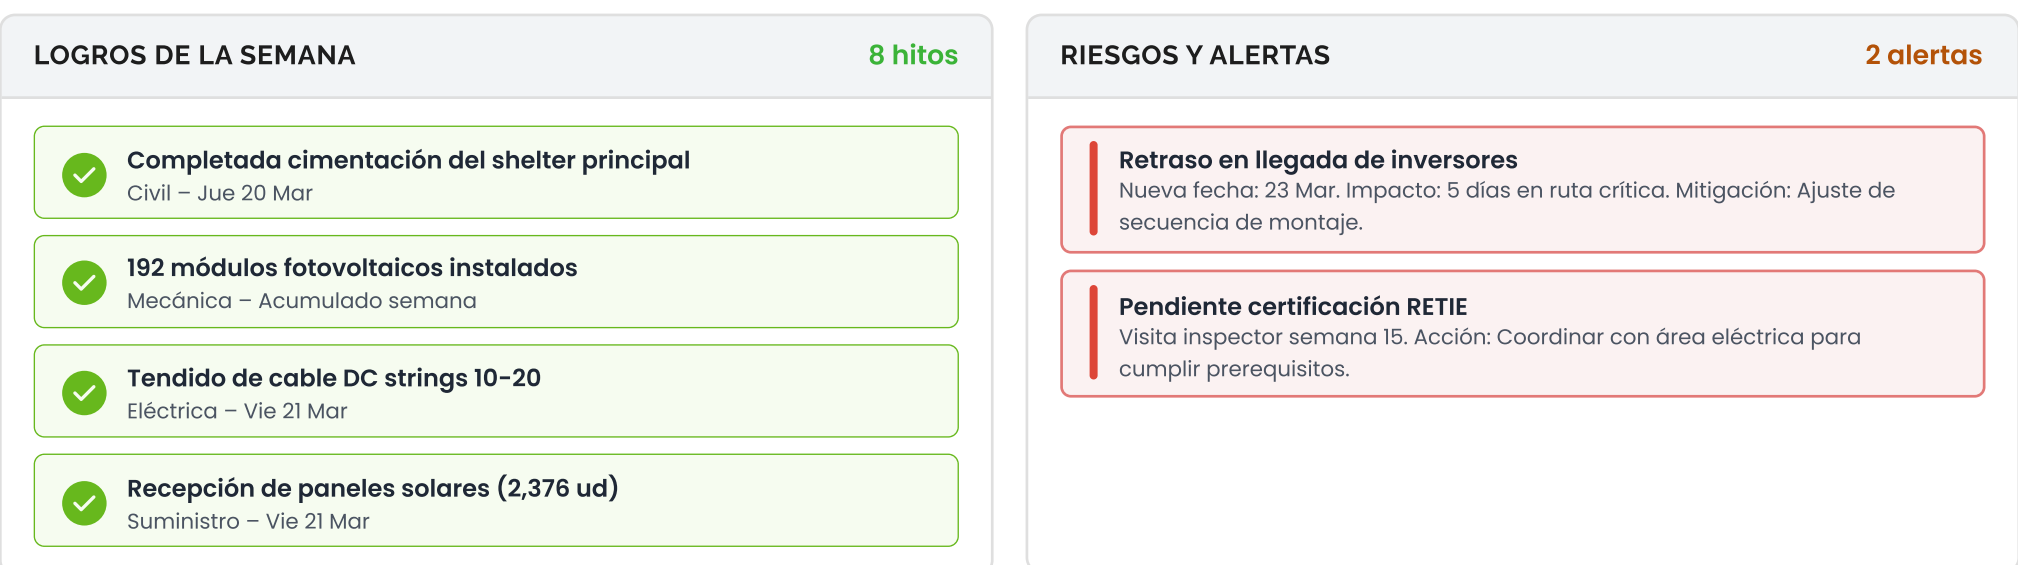

07 SEGUIMIENTO DE PROYECTO

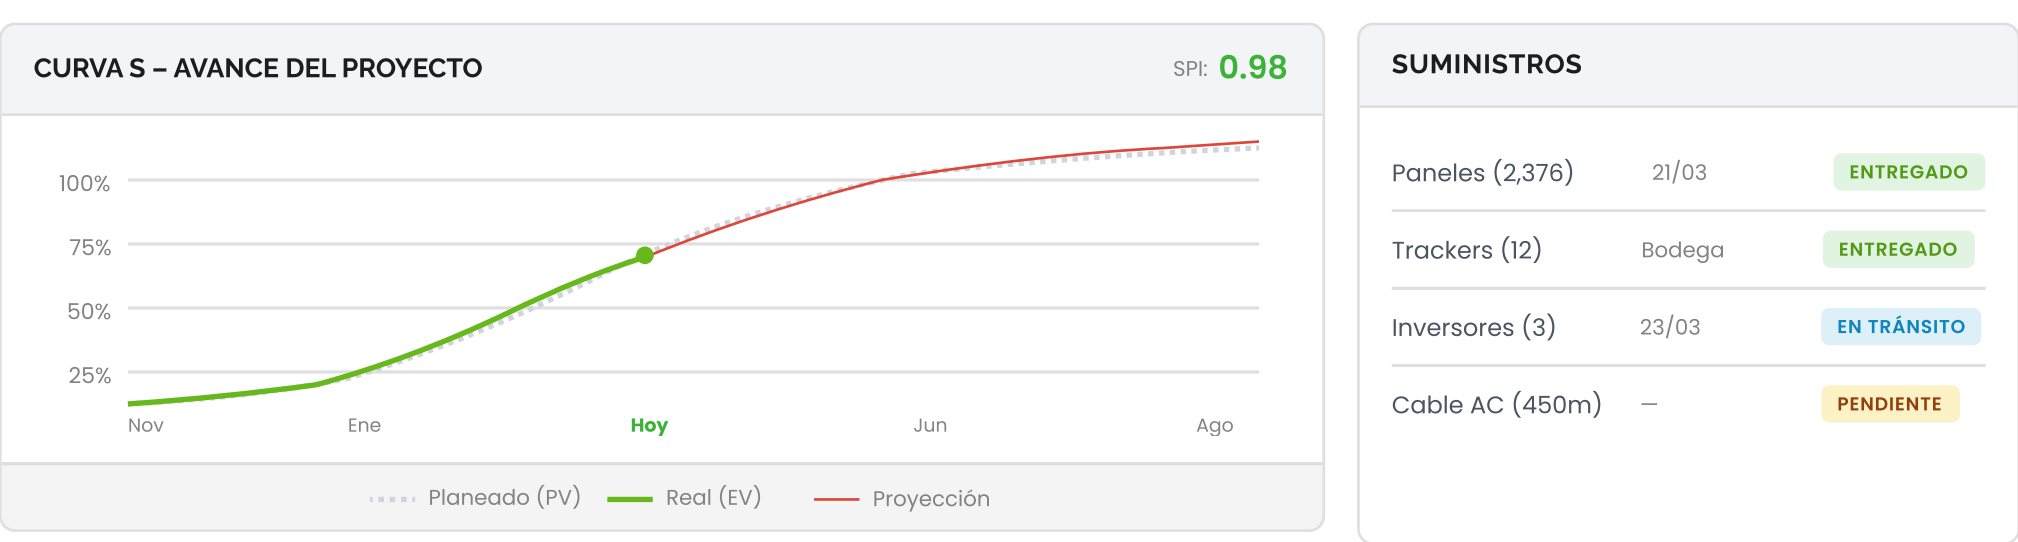

08 HITOS DE PAGO Y ESTADO FINANCIERO

HITO	DESCRIPCION	% COP	% USD	% EJECUTADO	ESTADO	FECHA
Anticipo	Pago inicial contra firma contrato	30%	30%	100%	PAGADO	15/11/25
H1	Llegada de equipos a sitio	20%	25%	100%	PAGADO	10/02/26
H2	50% montaje estructuras	15%	15%	84%	EN EJECUCION	–
H3	100% montaje paneles	15%	15%	42%	EN EJECUCION	–
H4	Precomisionamiento completado	10%	10%	0%	PENDIENTE	–
H5	COD – Operacion comercial	10%	5%	0%	PENDIENTE	–

\$485,200,000
VALOR FACTURADO COP

\$124,500 USD
VALOR FACTURADO USD

\$645,800,000
SALDO POR FACTURAR COP

Indicacion expresa: En el periodo reportado (Semana 12) NO se cumplio ningun hito de pago. El hito H2 (50% montaje estructuras) esta proyectada para Semana 14.

09 INDICADORES HSSE SEMANALES

SEGURIDAD	0 incidentes	AMBIENTAL	SOCIAL Y LABORAL
HH Solenium	68 h	Consumo Energía	Personal Total
HH Subcontratistas	161.5 h	Consumo Agua	Hombres / Mujeres
Total HH Semana	229.5 h	Residuos Ordinarios	% Mujeres
Incidentes	0	Residuos Reciclables	MOC Local
Cuasi Accidentes	0	RESPEL	MONC Local
HPI (Alto Potencial)	0	Derrames	PQRS Recibidas
Charlas SST	6	Permisos ambientales: Vigentes y en cumplimiento.	PQRS Resueltas
Simulacros	0		Horas Paralización

10 TRAZABILIDAD DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN

DISCIPLINA	DOCS GENERADOS	EN REVISION	VERSION 0 (APROBADOS)	% COMPLETITUD
General	8	0	8	100%
Civil	12	1	11	98%
Electrica	15	0	15	100%
Mecanica	10	0	10	100%
Comunicaciones	5	0	5	100%
TOTAL	50	1	49	99%

11 TAREAS Y COMPROMISOS

ACTIVIDAD / TAREA	RESPONSABLE	TIPO	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
Recepcion e inspeccion de inversores	Ing. Juan Perez	Solenium	23/03/26	Coordinar con logistica
Envio de documentacion para inspeccion RETIE	Ing. Carlos Lopez	Solenium	25/03/26	Requiere planos As-Built
Aprobacion de plano civil shelter (Rev. B)	Sun Factory	Cliente	24/03/26	En espera de comentarios
Confirmacion fecha llegada Cable AC	Proveedor ABC	Proveedor	22/03/26	Pendiente confirmacion
Completar montaje tracker fila 8	Contratista MEC	Subcontratista	26/03/26	Secuencia ajustada
Reunion de coordinacion semanal	Equipo completo	Solenium	24/03/26	Lunes 8:00 AM

12 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

